Id	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
0	**Gantt Proyecto de Planificacion v2.1**	**4%**	**303,94 día**	**02-11-16**	**21-12-17**	
15	2 Reporte Traspaso desde Hojas de Ruta A Cargos Ot	0%	0 días	04-01-17	04-01-17	
16	**3 Temparios**	**0%**	**146 días**	**16-12-16**	**29-06-17**	
17	**3.1 Definicion estructuras**	**0%**	**92 días**	**16-12-16**	**17-04-17**	
27	3.1.2 Listado de Productos por Marca y Modelo	0%	0 días	17-01-17	17-01-17	
31	3.1.4 Aplicación con opciones actualizadas, Según analisis	0%	0 días	23-01-17	23-01-17	
39	3.1.7 Listado de Tareas Estándar	0%	0 días	17-02-17	17-02-17	
46	3.1.9 Listado de Temparios	0%	0 días	17-04-17	17-04-17	
48	3.1.11 Aplicación para Administracion de Tempario	0%	0 días	14-04-17	14-04-17	
50	3.3 Aplicación HR incorporando Temparios	0%	0 días	05-05-17	05-05-17	
52	4 Reporte GenecionReporte Generacion Hojas de Ruta con Remparios	0%	0 días	29-06-17	29-06-17	
53	**5 Detalle de reparación**	**0%**	**36 días**	**05-05-17**	**22-06-17**	
58	5.5 Aplcacion administracion DR incorporando Temparios	0%	0 días	22-06-17	22-06-17	
59	6 Reporte Modificaciones Detalle de Reparacion	0%	0 días	29-06-17	29-06-17	
60	**7 Programacion de Trabajos**	**0%**	**55 días**	**15-06-17**	**29-08-17**	
64	7.3 Aplicación Administracion Centros de Trabajo	0%	0 días	19-07-17	19-07-17	
66	8 Reporte programación Semanal de Trabajos	0%	0 días	29-08-17	29-08-17	
67	**9 Planificacion**	**0%**	**80 días**	**29-08-17**	**21-12-17**	
69	9.2 Reporte Criterios Simulacion y Muestra Simulaciones	0%	0 días	25-10-17	25-10-17	
71	9.4 Reporte Escenario de Taller y reportes asociados	0%	0 días	21-12-17	21-12-17	
72	9.5 Aplicación Admnistracion plan de produccion	0%	0 días	21-12-17	21-12-17	
73	10 Resumen Final de Proyecto	0%	0 días	21-12-17	21-12-17	

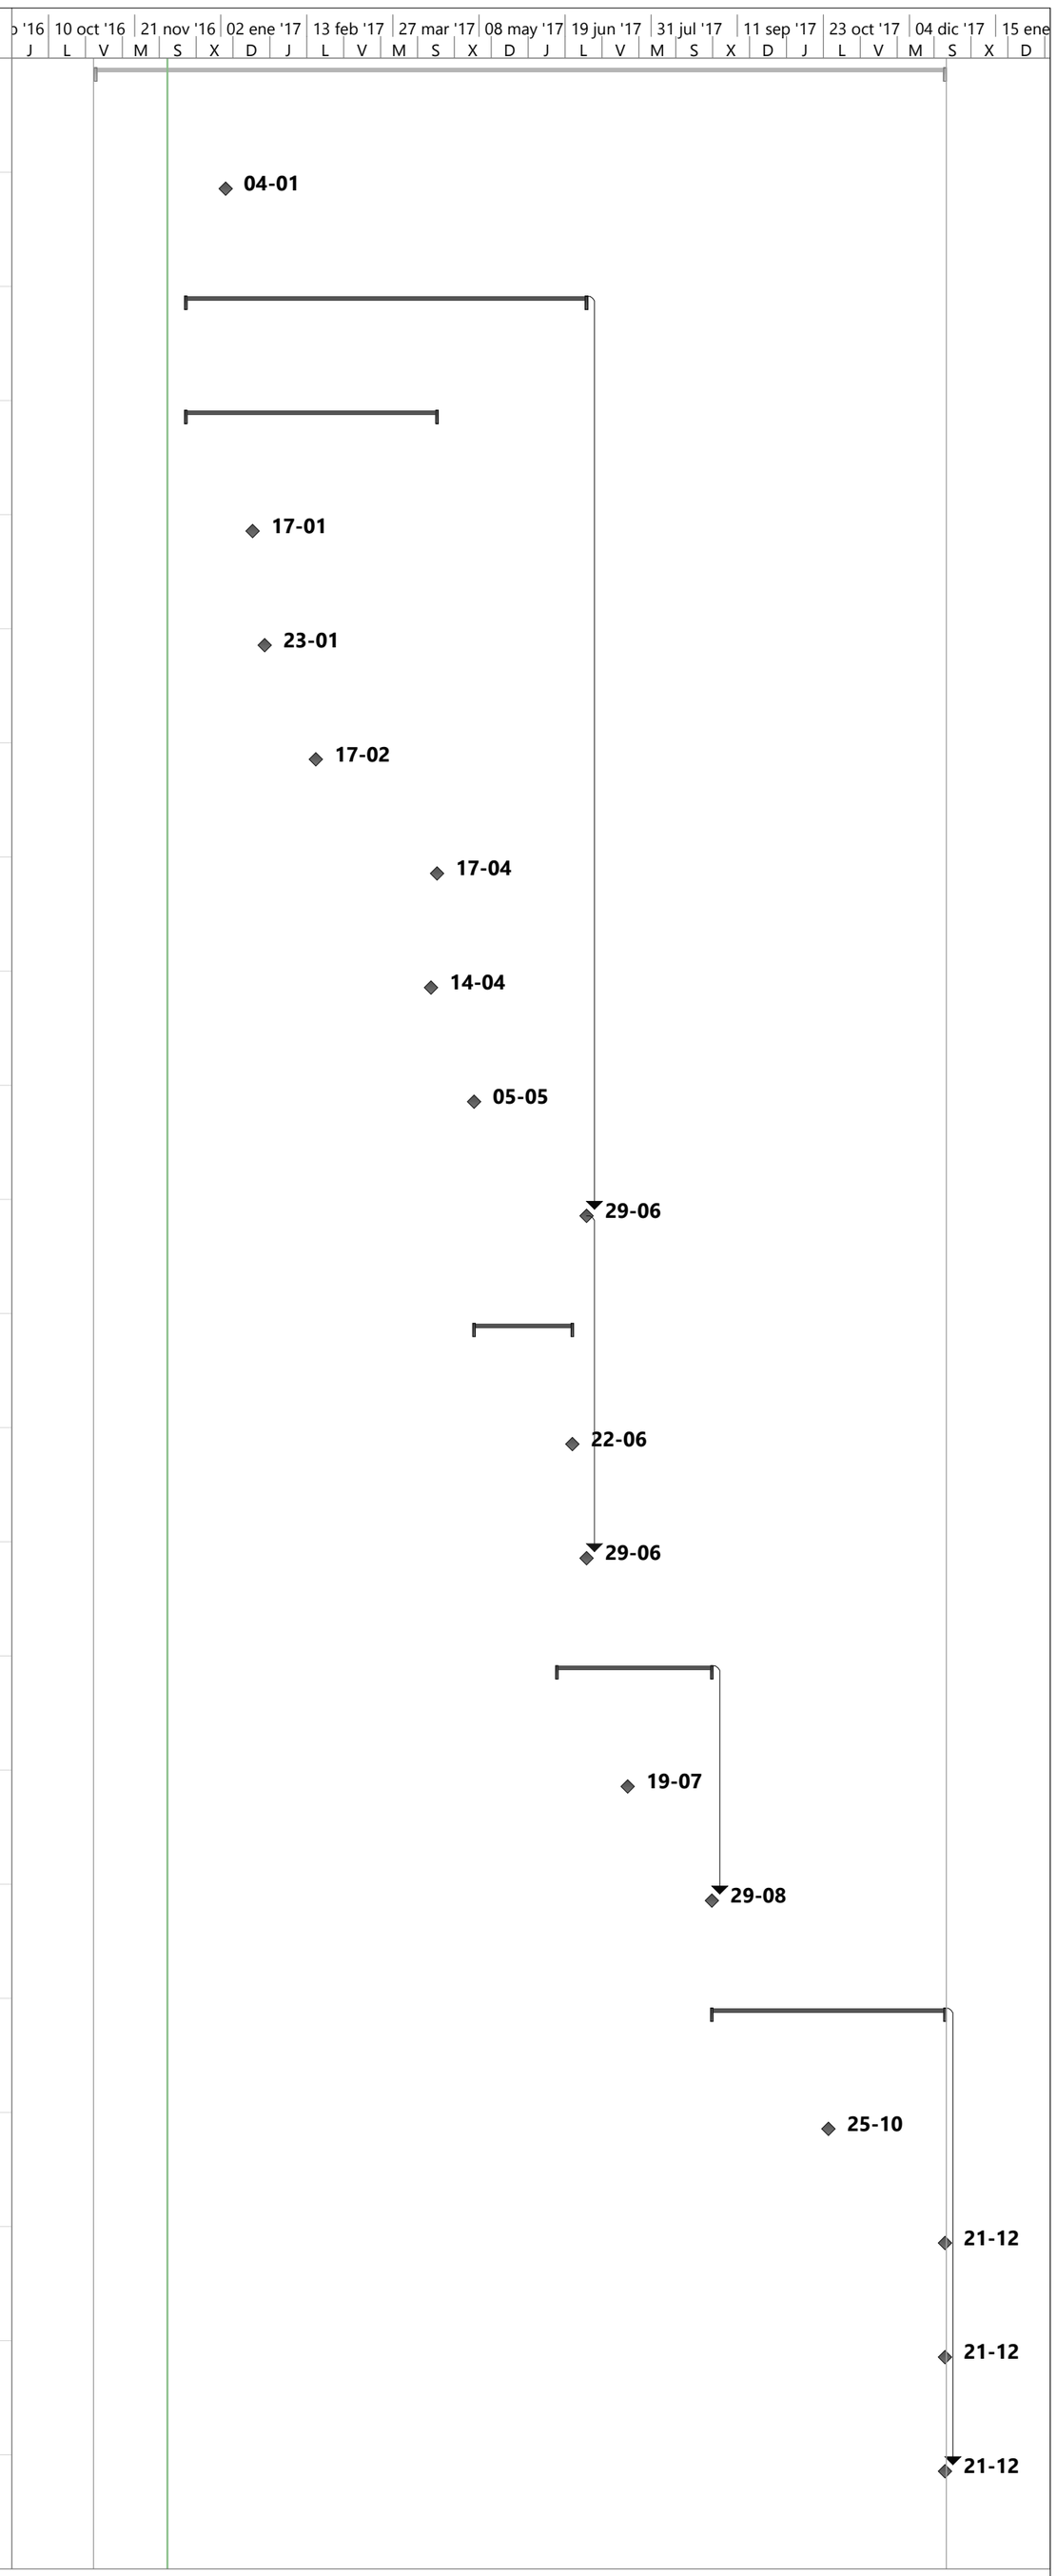

Proyecto: Gantt Proyecto de Pla
Fecha: 07-12-16

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			
